DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

[redacted]

Vaše značka/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/Tel.	Stráž pod Ralskem
	DIAMO-D100/1285/2026	[redacted]	2026-01-06

Žádost č. 37/2025
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane [redacted]

dne 25. 12. 2025 byla státnímu podniku DIAMO doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí:

„výsledků měření prašnosti na VÚ ř. 3 – pracoviště stáčení oxidu vápenatého CaO z vlakových cisteren a výroba vápenného mléka – hydroxidu vápenatého CA(OH)2 v hale příslušného pracoviště - za období roku 2025.“

Přípisem ze dne 29. 12. 2025 byla prodloužena lhůta k poskytnutí Vámi požadovaných informací.

Přílohou Vám zasíláme protokoly o měření prašnosti na PÚ č. 3 (tj. Protokol č. 43/2025 o měření frakcí polétavého prachu a ovzduší a Protokol č. 173/25 o radiometrickém měření) a taktéž výsledky laboratorních měření prašnosti, na jejichž základě se zpracovávají tyto protokoly. Všechna měření byla s výsledkem <1 [mg.m^3]. Tento stav je tak vyhovující dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí odboru právního

Přílohy

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Stráž pod Ralskem

Protokol č. 43/2025
o měření frakcí polétavého prachu a ovzduší

Datum: 1. 12. 2025 Čas: 10^{05} - 10^{50}

Měření bylo provedeno ve smyslu přílohy č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měřil: [redacted] Měření přítomen: [redacted]

Místo měření: 703 – NDS ML – příprava vápenného mléka

Měřicí přístroj: QUICK Take 30	Kalibrační list č.: 7567


Měřená veličina a použitá metoda měření: polétavý prach, dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na vědomí:		Pare č.:	
Datum vyhotovení:	18. 12. 2025		
Zpracoval:	[redacted]	Podpis:	[redacted]
Schválil:		Podpis:	

Nedílnou součástí tohoto záznamu jsou další strany, na nichž je zdokumentována polohopisná situace včetně referenčních míst, dílčí naměřené hodnoty, popis prováděných pracovních činností a vyhodnocení měření.

Polohopisná situace: hala přípravy vápenného mléka

Náčrtek objektu se zařízením a s měřícími body (X)

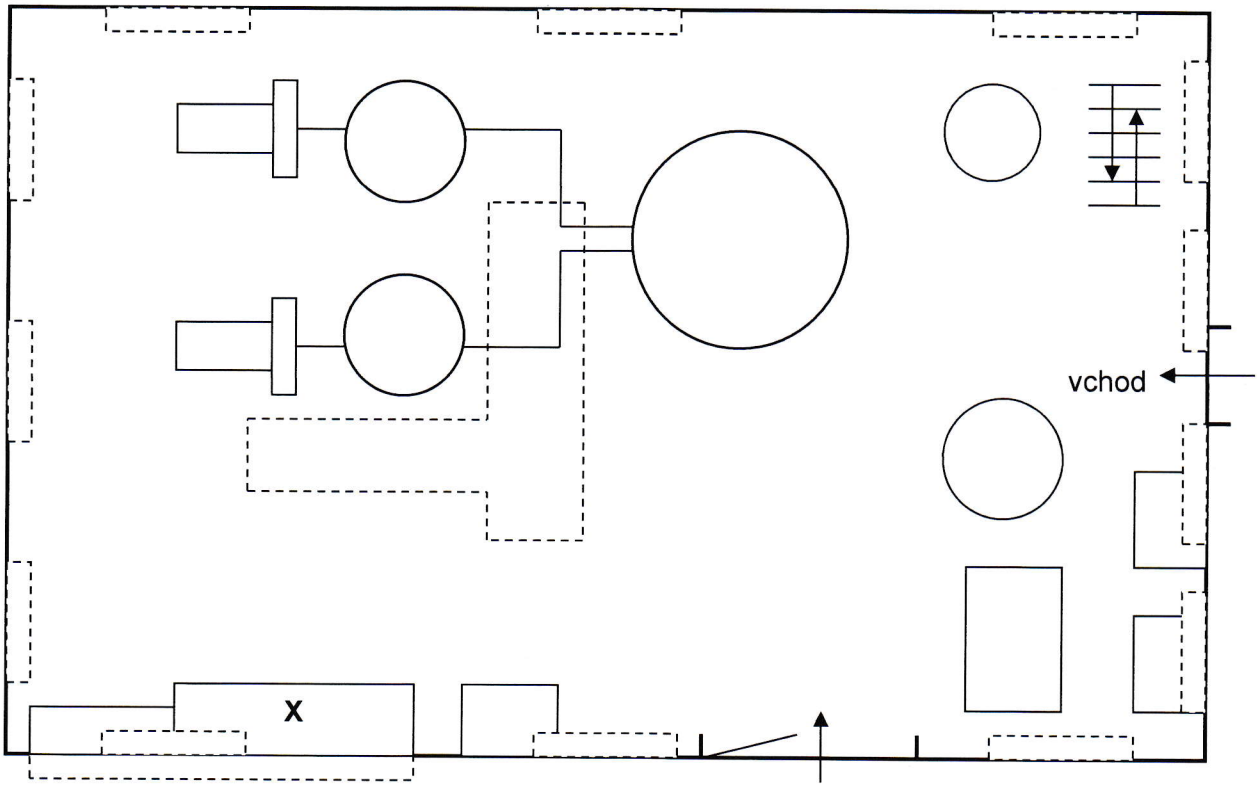

Naměřené hodnoty

Místo měření	Výsledek měření [mg.m^{-3}]
bod X	<1

Popis prováděných pracovních činností: technologie v automatickém režimu -
- pochůzka, drobné manipulace, kontrolní činnost

Podmínky a postup měření:
- v době měření se v prostoru pohyboval 1 pracovník
- měření bylo provedeno ve výšce 1,50m

Tabulka referenčních hodnot

Látka	PEL$_C$ [mg.m^{-3}]	PEL [mg.m^{-3}]
polétavý prach	10,00	-

Závěr:

Stávající stav **v y h o v u j e** dle nařízení vlády č.361/2007 Sb.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Středisko laboratoří - zkušební laboratoř
Pod Vinicí 83
471 27 Stráž pod Ralskem

Z-05-*SI-TÚU-22-01-01-01*

PROTOKOL O RADIOMETRICKÉM MĚŘENÍ

- výsledky laboratorních analýz pracovního prostředí

Zákazník:	OBOZP	**Protokol č.:**	173/25
		Celkem stran:	1
Datum vystavení protokolu:	18.12.2025	**Strana číslo:**	1
Označení vzorku:	příprava vápenného mléka		
Vzorky přijaty dne:	2.12.2025	**Počet vzorků:**	1
Datum a údaje o odběru vzorků:	1.12.2025 43 - 703 - NDS ML - příprava vápenného mléka (PS 03, 103)		
Datum provedení analýz:	2.12. - 5.12.2025		

Laboratorní číslo	Označení vzorku	Označení filtru	Frakce polétavého prachu		A_{VAL}
			Respirabilní	Vdechovatelná	
			[mg . m^{-3}]	[mg . m^{-3}]	[Bq . m^{-3}]
298	příprava vápenného mléka	Q		<1,0	

Monitorovací úrovně	A_{VAL} [Bq . m^{-3}]
Vyšetřovací	
Zásahová	

Poznámka:

[redacted]
vedoucí laboratoře

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Stráž pod Ralskem

Protokol č. 44/2025
o měření frakcí polétavého prachu a ovzduší

Datum: 1. 12. 2025 Čas: 10^{10} - 10^{55}

Měření bylo provedeno ve smyslu přílohy č. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měřil: [redacted] Měření přítomen: [redacted]

Místo měření: 703 – NDS ML – přístřešek pro stáčení CaO

Měřicí přístroj: QUICK Take 30	Kalibrační list č.: 7567


Měřená veličina a použitá metoda měření: polétavý prach, dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na vědomí:		Pare č.:	
Datum vyhotovení:	18. 12. 2025		
Zpracoval:	[redacted]	Podpis:	[redacted]
Schválil:	[redacted]	Podpis:	[redacted]

Nedílnou součástí tohoto záznamu jsou další strany, na nichž je zdokumentována polohopisná situace včetně referenčních míst, dílčí naměřené hodnoty, popis prováděných pracovních činností a vyhodnocení měření.

Polohopisná situace: přístřešek pro stáčení CaO

Náčrtek objektu se zařízením a s měřícími body (X)

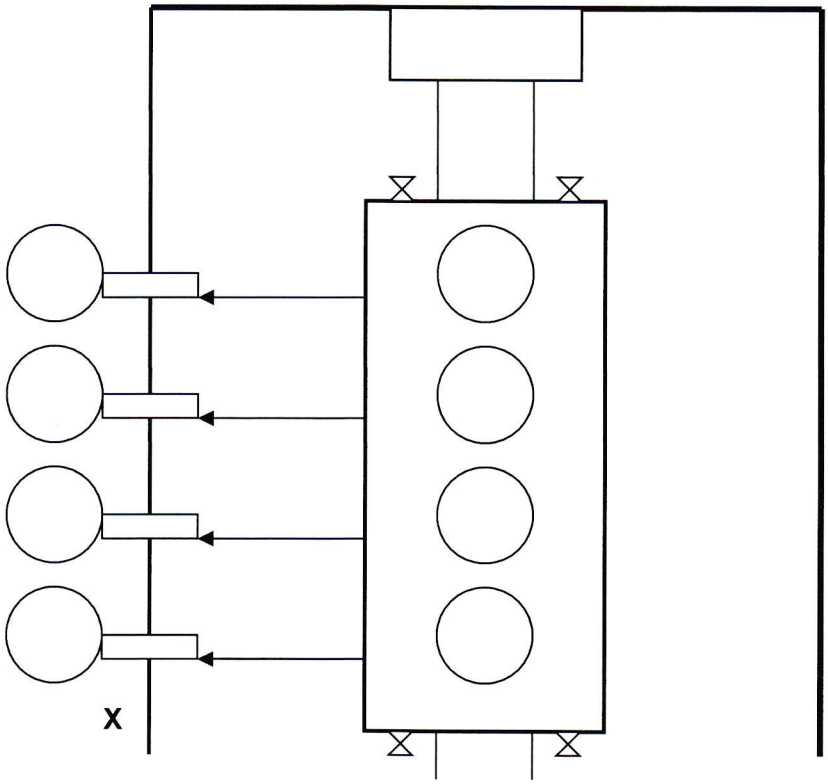

Naměřené hodnoty

Místo měření	Výsledek měření [mg.m^{-3}]
bod X	<1

Popis prováděných pracovních činností: mechanická dílna

Podmínky a postup měření:
- v době měření se v prostoru pohyboval 1 pracovník
- měření bylo provedeno ve výšce 1,50

Tabulka referenčních hodnot

Látka	PEL$_C$ [mg.m^{-3}]	PEL [mg.m^{-3}]
polétavý prach	10,00	-

Závěr:

Stávající stav **v y h o v u j e** dle nařízení vlády č.361/2007 Sb.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Středisko laboratoří - zkušební laboratoř
Pod Vinicí 83
471 27 Stráž pod Ralskem

Z-05-*SI-TÚU-22-01-01-01*

PROTOKOL O RADIOMETRICKÉM MĚŘENÍ

- výsledky laboratorních analýz pracovního prostředí

Zákazník:	OBOZP	**Protokol č.:**	172/25
		Celkem stran:	1
Datum vystavení protokolu:	18.12.2025	**Strana číslo:**	1
Označení vzorku:	Přístřešek pro stáčení CaO		
Vzorky přijaty dne:	2.12.2025	**Počet vzorků:**	1
Datum a údaje o odběru vzorků:	1.12.2025 44 - 703 - NDS ML - přístřešek pro stáčení CaO		
Datum provedení analýz:	2.12. - 5.12.2025		

Laboratorní číslo	Označení vzorku	Označení filtru	Frakce polétavého prachu		A_{VAL}
			Respirabilní	Vdechovatelná	
			[mg . m^{-3}]	[mg . m^{-3}]	[Bq . m^{-3}]
297	Přístřešek pro stáčení CaO	P		<1,0	

Monitorovací úrovně	A_{VAL} [Bq . m^{-3}]
Vyšetřovací	
Zásahová	

Poznámka:

[redacted]
vedoucí laboratoře
